



**INFORME DE MONITOREO
PROCIENCIA**

INFORME SEMESTRAL

PERIODO INFORMADO: 2° TRIMESTRE 2021

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACYT

Fecha de Presentación : Octubre 2021

[illegible]

38.634.740

(14.964.390)

7.500.000



7.500.000

(16.170.350)

OBSERVACIÓN: El monto programado representa a lo indicado en el Sistema STF de la AFD.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		TOTAL		
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Reintegro	Ejecutado
Componente 1: Fomento a la Investigación científica	40.207.027.475	40.207.027.475	28.935.723.213	28.935.723.213	64.674.412.700	64.674.412.700	87.859.320.622	87.859.320.622	50.323.216.630	50.323.216.630	26.018.054.395	25.982.457.277	43.470.562.815	34.364.191.023	55.447.668.722	21.252.396.456	362.740.714.306	37.281.380.739	374.562.309.841
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	5.097.515.482	5.097.515.482	4.587.274.194	4.587.274.194	8.179.306.355	8.179.306.355	9.951.024.252	10.096.691.098	10.042.181.224	10.042.181.224	6.617.084.098	7.343.728.671	4.236.804.338	6.587.754.121	4.461.167.000	2.403.115.874	51.114.905.817	4.804.050.781	53.188.496.900
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	11.832.990.676	11.832.990.676	17.700.292.020	17.700.292.020	4.970.408.874	4.970.408.874	15.417.897.556	15.417.897.556	18.385.915.052	18.385.915.052	9.334.648.215	9.334.648.215	21.546.893.764	21.546.893.764	15.355.257.488	11.281.488.862	110.470.545.019	2.805.772.853	105.532.073.838
Componente 4: Iniciación y Apropiación Social de la CyT	37.248.480	37.248.480	5.555.477.916	5.555.477.916	4.953.073.915	4.939.873.915	6.485.843.261	6.508.804.861	7.277.154.801	7.283.294.764	2.264.688.534	2.372.996.603	360.280.599	285.719.596	105.743.726	157.567.352	27.091.334.858	987.975.860	26.853.440.265
Costo UEP	398.620.110	398.620.110	1.111.898.423	1.111.898.423	3.152.591.125	3.165.791.125	3.607.417.761	3.607.417.761	4.918.645.366	4.918.645.366	5.005.448.374	5.030.090.676	5.861.251.590	2.900.662.526	3.780.416.126	2.558.804.309	29.032.500.000	8.755.835	24.571.683.896
TOTAL	57.573.402.223	57.573.402.223	57.890.665.766	57.890.665.766	85.929.792.969	87.126.866.853	123.322.103.452	123.490.131.898	90.947.113.073	90.953.253.036	49.439.523.616	50.063.911.442	75.475.793.106	65.685.221.030	79.140.253.062	40.071.205.795	580.650.000.000	45.887.936.068	584.708.006.740

Año	Programado	Ejecutado
2014	57.573.402.223	57.573.402.223
2015	57.890.665.766	57.890.665.766
2016	85.929.792.969	87.126.866.853
2017	123.322.103.452	123.490.131.898
2018	90.947.113.073	90.953.253.036
2019	49.439.523.616	50.063.911.442
2020	75.475.793.106	79.140.253.062
2021	40.071.205.795	15.470.801.964
TOTAL	580.650.000.000	545.238.484.280

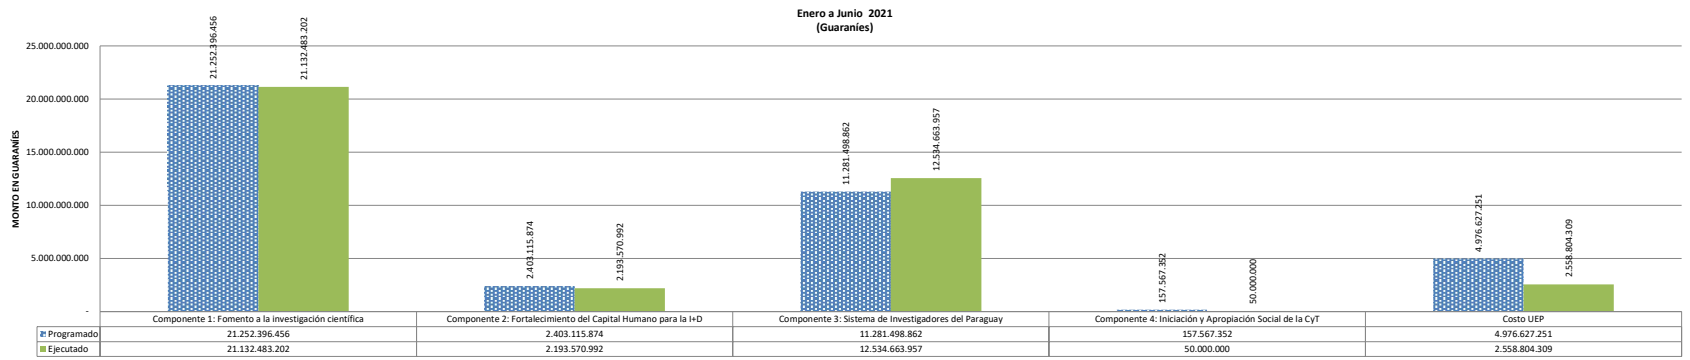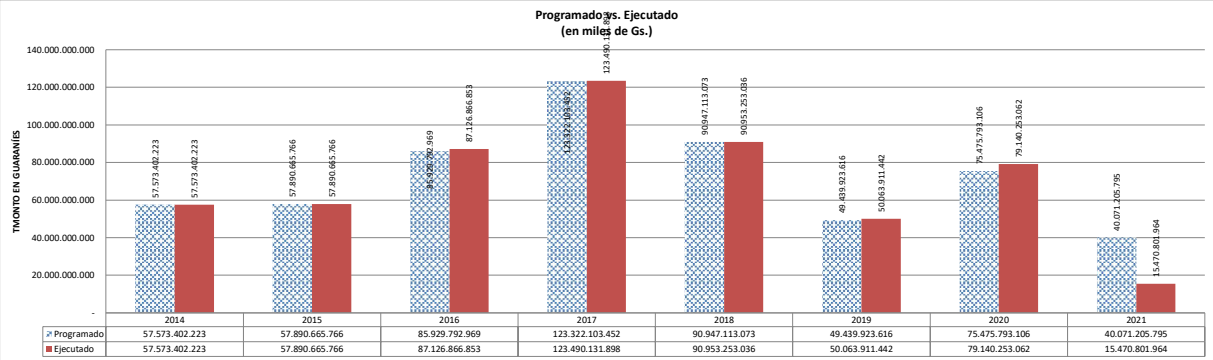

PARTE 7 - AVANCE FISICO (Productos Programados/Ejecutado)

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
30/9/2021	CONACYT

Componentes	Instrumentos	Unidad	Metas	P: Programado E: Ejecutado	Avance de los Productos														TOTAL	
					1	2		3		4		5		6		7		8		
					31/12/2014	30/6/2015	31/12/2015	30/6/2016	31/12/2016	30/6/2017	31/12/2017	30/6/2018	31/12/2018	30/6/2019	31/12/2019	30/6/2020	31/12/2020	30/6/2021		31/12/2021
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.1.1 Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D adjudicados	638	P	200	100		100	114						124					638
				E	140	194	8	2	177	32	-18	-12	-1	-6	-2	98	48	-10	-1	649
	I.1.2 Eventos científicos emergentes	Eventos científicos emergentes adjudicados	40	P					13		15	3	3	3	3					40
				E							11	10	4	10	1	11	5	-3		
	I.2.1 Oficinas de transferencia de tecnología y resultados de la investigación	OTRI	6	P						3					3					6
				E							3							5		
	I.2.2 Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de solicitud de patentes	60	P								30			30					60
				E										115		0				
	I.3.1 Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación	Laboratorios	21	P					7					10			4			21
				E								17			0		6			
	I.4.1 Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCO	Portal	1	P	1															1
				E		1														
	I.5.1 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Set de encuestas	7	P	2							1		1		1	1	1		7
				E				1	1			1		1	0	1	1			
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.1.1 Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados adjudicados	35	P	14				6		15									35
				E	18	2	-1		1	5	1	10	-1		0					35
	II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales	Estudiantes con incentivo	222	P			108		36		45	33								222
				E			100				38	-1	24	47	12					
	II.2.4 Financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos	Estancias de vinculación	267	P	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	7					267
				E	15	5	30	13	44	4	52	28	45	31						
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	III.1.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	732	P	732		732		732		732		732		732		732		732	732
				E	397		514		528		429		745		677	564	512	440	445	745
	III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	P							1		2		3	3				9
E										1	0	2	0	0		9				12
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.2.1 Formación docente para investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Personas formadas	400	P					50	50	50		150		100					400
				E					56	70	40		228	-7		234				
	IV.3.1 Programa centros de recursos de aprendizaje para la ciencia y tecnología	Plataforma	1	P						1										1
				E							1									
	IV.4.1 Concursos de comunicación y periodismo científico	Concursos	5	P			1		1		1		1		1					5
				E			1		2				2		2				3	
	IV.5.1. Diseño de espacios y museos de CyT	Asesoría técnica	1	P										1						1
				E											1					
	IV.6.1. Ferias, olimpiadas y concursos de CyT	Actividades científicas	39	P	1		4		10		10		10		4					
E				1		4	3	8			12	2	10	2	5	1	1			

Observación: Se puede notar que ciertas metas ejecutadas disminuyen, específicamente se presentan renunciaciones y/o cancelaciones de adjudicaciones, en proyectos de I+D, programas de posgrados, becarios, entre otros.

Para el producto II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en postgrados nacionales, se ha realizado una revisión del indicador, y se incluyen los adjudicados cancelados pero que han recibido alguna transferencia como incentivo por lo menos una vez.

Igualmente, se ha realizado los ajustes de metas programadas en relación a la Resolución CAFEI N° 12/2019 que aprueba las modificaciones del programa.

PARTE 8 - EJECUCION FINANCIERA (Guaraníes)

EJECUCION FINANCIERA (Guaraníes)					FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					30/9/2021	CONACYT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	COSTO TOTAL (Gs.)	OG / PGN	AVANCE FINANCIERO (Ejecución Acumulada en Guaraníes)												2021		TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					2014	2015	2016		2017		2018		2019		2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					31/12/2014	30/6/2015	31/12/2015	30/6/2016	31/12/2016	30/6/2017	31/12/2017	30/6/2018	31/12/2018	30/6/2019	31/12/2019	30/6/2020	31/12/2020	30/6/2021	30/9/2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Componente 1: FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	1.1 Proyectos de Investigación y desarrollo	638 proyectos de I+D financiados	252.420.031.524	839	R	38.696.033.535		14.300.186.741		51.341.539.082		72.010.474.584		26.675.307.785		9.315.692.470		26.827.708.248		252.420.031.524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					P	38.696.033.535	100%	-	0%	14.300.186.741	100%	-	0%	51.341.539.082	100%	13.561.815.180	19%	72.010.474.584	100%	9.496.369.795	36%	26.675.307.785	100%	30.687.171.610																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.253.089.081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1.1.2 Fondos para eventos emergentes	40 eventos científicos (emergentes)	2.960.186.937	839	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.960.186.937																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.960.186.937																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.816.513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1.2 Fondos para la transferencia de resultados de investigación al sector privado y público	6.642.495.100	6 OTB	4.710.000.000	839	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.642.495.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.642.495.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.816.513																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1.2.1 Fondos para la creación de oficinas de transferencia de resultados de la I	60 patentes solicitadas	1.932.495.100	852	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932.495.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932.495.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932.495.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1.3 Fondos para Protección de Infraestructura y Equipamiento para la Investigación	17 laboratorios fotográficos y equipados para la investigación	21.160.007.097	260	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.160.007.097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.160.007.097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.160.007.097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1.4 Acceso a información científica y tecnológica: Portal OCCO	Acceso al portal OCCO	52.064.652.150	260	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.064.652.150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.064.652.150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.064.652.150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1.5 Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	5 set de indicadores de CyT medidos	2.932.882.595	852	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.932.882.595																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.932.882.595																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.932.882.595																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	1.6 Otros gastos inherentes al componente.		20.555.079.622		R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.555.079.622																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.555.079.622																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.555.079.622																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Componente 2: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO PARA LA I+D	Remuneración Adicional			125	R	1.225.993.940	100%	-	0%	1.978.236.472	100%	-	0%	2.725.873.677	100%	2.461.050.627	67%	3.652.783.596	100%	2.201.206.269	68%	3.224.185.774	100%	1.089.156.608	31%	3.504.922.331	100%	511.500.000	0%	970.945.500	0%	605.935.000	0%	417.962.500	0%	17.794.441.190	87%	17.794.441.190																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
P						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PARTE 9 - SEGUIMIENTO A PROCESOS

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	1.1. Financiamiento de Proyectos de I+D.	1.1.1 Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D).	Proyectos de I+D - Convocatoria 2014 <u>Datos del trimestre:</u> Nº Contratos Firmados: 0; N° 1° Desembolso Realizado: 0; N° 2° Desembolso Realizado: 0; N° 3° Desembolso Realizado: 4; N° Informes Finales Presentados: 0; N° de Actas de Cierre Firmadas: 48. <u>Actividades del trimestre:</u> Se han remitido las actas de cierre para las firmas correspondientes y se ha realizado el seguimiento del proceso. Del mismo modo, se ha realizado el seguimiento de las devoluciones pendientes de los fondos, en el caso de proyectos rescindidos y aquellos que no han ejecutado en su totalidad. Proyectos de I+D - Convocatoria 2015 <u>Datos del trimestre:</u> Nº Contratos Firmados: 0; N° 1° Desembolso Realizado: 0; N° 2° Desembolso Realizado: 1; N° 3° Desembolso Realizado: 3; N° Informes Finales Presentados: 9; N° de Actas de Cierre Firmadas: 57. <u>Actividades del trimestre:</u> Se procesaron las solicitudes de las instituciones beneficiarias de los segundos y terceros desembolsos de recursos para la culminación de los proyectos de investigación. Se recepcionaron y revisaron las rendiciones técnicas y financieras de los proyectos, así como la gestión para la revisión de los informes finales. Se realizó el procesamiento de las solicitudes de adendas del plazo de los proyectos, debido a los retrasos en la ejecución y cierre generados por la pandemia de la COVID-19 e inconvenientes administrativos reportados por las instituciones. Se realizaron procedimientos técnicos y administrativos, como la gestión de la firma de las actas de cierre, relacionados con la finalización de los proyectos de investigación. Proyectos de I+D - Convocatoria 2018 <u>Datos del trimestre:</u> Nº Contratos Firmados: 0; N° 1° Desembolso Realizado: 0; N° 2° Desembolso Realizado: 39; N° 3° Desembolso Realizado: 0; N° Informes Finales Presentados: 2; N° Actas de Cierre Firmadas: 0. <u>Actividades del trimestre:</u> Se realizó el acompañamiento y seguimiento para la presentación de los informes técnicos semestrales conforme a la guía de ejecución vigente. Se efectuó la revisión de los informes técnicos y rendiciones administrativas, para el procesamiento de los segundos desembolsos, como cumplimiento de lo establecido en la guía de ejecución. Se procesaron las solicitudes de segundos desembolsos remitidos por las instituciones beneficiarias. Se procedió a la rescisión del contrato de un proyecto de investigación, debido a la renuncia de la institución, formalizada a través de la resolución N° 255/2021 en el mes de agosto. Se han remitido notificaciones a todas las instituciones de la convocatoria 2018, a fin de comunicar el estado de los proyectos y la proximidad de la finalización del plazo de ejecución conforme las condiciones contractuales. Se han realizado reuniones virtuales con las instituciones, a fin de concertar esfuerzos para el cierre de los proyectos. Proyectos de I+D para Programa de Reparación y Radicación de Investigadores del Exterior <u>Datos del trimestre:</u> Nº Contratos Firmados: 0; N° 1° Desembolso Realizado: 0; N° 2° Desembolso Realizado: 0; N° 3° Desembolso Realizado: 0; N° Informes Finales Presentados: 0; N° Actas de Cierre Firmadas: 0. <u>Actividades del trimestre:</u> Se realizó el acompañamiento y seguimiento a los beneficiarios para la presentación de los primeros informes técnicos semestrales conforme a la guía de ejecución vigente. Proyectos de I+D - Convocatoria 2020 Contexto de pandemia COVID-19 <u>Datos del trimestre:</u> Nº Contratos Firmados: 0; N° 1° Desembolso Realizado: 1; N° 2° Desembolso Realizado: 10; N° 3° Desembolso Realizado: 0; N° Informes Finales Presentados: 9; N° Actas de Cierre Firmadas: 9. <u>Actividades del trimestre:</u> Se realizaron las transferencias de los montos asignados a los proyectos, correspondientes a los primeros y segundos desembolsos, para la ejecución de las actividades de investigación. Se realizó el acompañamiento y seguimiento a las instituciones beneficiarias para la presentación de los informes técnicos, conforme a la guía de ejecución vigente. Se procedió a la revisión y el procesamiento de las adendas de ejecución y vigencia de los proyectos de investigación. Se han revisado los informes de avance y de rendiciones de cuenta, presentadas por las instituciones. Se llevó a cabo la recepción y aprobación de los informes finales de los proyectos de investigación, así como de rendiciones de cuenta, que se encuentran en proceso de cierre de sus actividades. Se efectuó el procesamiento y la gestión de las firmas de las actas de cierre de los proyectos con actividades de investigación finalizadas. Se han remitido notificaciones a todas las instituciones de la convocatoria 2020, a fin de comunicar el estado de los proyectos y la proximidad de la finalización del plazo de ejecución conforme las condiciones contractuales. Proyectos de I+D - Convocatoria 2020 B Contexto de post pandemia de la COVID-19 <u>Datos del trimestre:</u> Nº Contratos Firmados: 0; N° 1° Desembolso Realizado: 0; N° 2° Desembolso Realizado: 0; N° 3° Desembolso Realizado: 0; N° Informes Finales Presentados: 1; N° Actas de Cierre Firmadas: 0. <u>Actividades del trimestre:</u> Se realizó el seguimiento técnico para la presentación de las solicitudes de transferencias de montos asignados para la ejecución de las actividades de investigación. Se han revisado los informes técnicos de avance y finales, así como las rendiciones de cuenta, para el cierre de los proyectos. Proyectos de cooperación internacional Programas Regionales STIC-Amsud, Math-Amsud y CLIMAT Amsud Convocatoria 2019 <u>Datos del trimestre:</u> Nº Contratos Firmados: 2; N° 1° Desembolso Realizado: 2; N° 2° Desembolso Realizado: 0; N° 3° Desembolso Realizado: 0; N° Informes Finales Presentados: 0; N° de Proyectos Finalizados: 0. <u>Actividades del trimestre:</u> Se realizó la firma de los contratos de los dos proyectos adjudicados. Se efectivizaron los desembolsos de los montos adjudicados para la ejecución de los proyectos de investigación. Se activó el funcionamiento del Sistema de Población e Instrumentos (SPI) del CONACYT para la presentación de los informes de actividades y rendiciones de cuentas de las investigaciones. Programas Regionales STIC-Amsud, Math-Amsud y CLIMAT Amsud Convocatoria 2020 <u>Datos del trimestre:</u> Nº Contratos Firmados: 0; N° 1° Desembolso Realizado: 0; N° 2° Desembolso Realizado: 0; N° 3° Desembolso Realizado: 0; N° Informes Finales Presentados: 0; N° de Proyectos Finalizados: 0. <u>Actividades del trimestre:</u> Se gestionó el proceso de la firma del contrato y el desembolso del recurso para la ejecución del proyecto de investigación. Convocatorias del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) Convocatoria 2020 <u>Datos del trimestre:</u> N° de Redes Temáticas Adjudicadas: 0; N° de Inicio de Actividades: 3. Se iniciaron las actividades de todas de las redes temáticas adjudicadas, la red sobre saneamiento de recursos hídricos mediante tecnologías innovadoras y sustentables (Red AMARU), red sobre obtención de films biodegradables de origen 100% natural para la industria de alimentos, red sobre mujeres emprendedoras sociales y red sobre hidrógeno: producción y usos en el transporte y el sector eléctrico. Los cuatro proyectos con participación de investigadores paraguayos se encuentran en el primer año de ejecución del periodo 2021-2024. Convocatorias del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) Convocatoria 2021 La convocatoria tuvo un total de 64 postulaciones presentadas, de las cuales 12 propuestas cuentan con grupos de investigación de Paraguay, que representan el 19% de las postulaciones. Las postulaciones se encuentran en proceso de evaluación que finalizará en el mes de noviembre de 2021 durante la realización de la asamblea general del programa. El programa tiene por finalidad crear redes de grupos de investigación y empresas de Iberoamérica que trabajen en conjunto para resolver problemáticas comunes desde una perspectiva local.	a) Solicitudes de adendas de plazo de ejecución y vigencia, de proyectos de las convocatorias 2015 y 2020, a causa de la pandemia de la COVID-19 e inconvenientes reportados por las instituciones, que han impactado en el desarrollo de las actividades y procesos de investigación, tales como el cierre de los proyectos y la presentación de los resultados finales.	a) Se ha realizado el seguimiento continuo del estado de los vencimientos de los contratos de las instituciones, y de las obligaciones pendientes, a fin de comunicar y programar reuniones resolutorias.	Diana Romero	Ninguna
				b) Solicitudes de extensión de la vigencia de los proyectos, a fin de subsanar los inconvenientes administrativos que las instituciones beneficiarias experimentan en el proceso de cierre, así como los numerosos pedidos de excepción a lo establecido en la guía de ejecución.	b) Se efectuó de forma continua asistencia a las instituciones beneficiarias de las diferentes convocatorias y atendiendo al plazo finito del programa PROCENCIA, en la regularización de sus compromisos contractuales y en la remisión de sus informes técnicos y administrativos.		
				c) Retrasos en el cumplimiento contractual, relacionados a la entrega de informes técnicos y administrativos, de los proyectos de las convocatorias, que generan demoras considerando que el CONACYT debe invertir tiempo para realizar las notificaciones correspondientes.	c) Se ha analizado, por parte del equipo técnico, cada inconveniente presentado por las instituciones beneficiarias, en la búsqueda de soluciones para el cierre efectivo de los proyectos.		
				d) Dificultades para el cierre de los proyectos rescindidos, tanto por CONACYT como por parte de la institución, debido a la falta de la devolución por parte de las instituciones de los desembolsos realizados. La devolución de los recursos se encuentra establecida en la guía de ejecución del instrumento.	Se remitieron y gestionaron las notificaciones formales a las autoridades de las instituciones con proyectos de las convocatorias 2018 y 2020, a fin de comunicar la proximidad del cierre de PROCENCIA y el estado de las carteras correspondientes.		
				e) Inconvenientes administrativos experimentados por las instituciones, para las adquisiciones y contrataciones debido a los procesos de licitación requeridos, así como en la entrega en tiempo y forma por parte de los proveedores.	d) Se ha realizado el seguimiento de las devoluciones pendientes de fondos, por proyectos rescindidos tanto por CONACYT como por parte de las instituciones.	Diana Romero	Ninguna
				e) Solicitud tardía de los fondos para la ejecución de las actividades de los proyectos, lo cual genera contratiempos en la gestión del CONACYT.	Se ha trabajado de forma conjunta con las áreas de rendición de cuentas y asesoría legal, con el objetivo de planificar acciones para el cierre de los proyectos de las diferentes convocatorias.		
				g) Dificultades en la ejecución de la contrapartida, por parte de las instituciones públicas y privadas, lo cual genera inconvenientes para el cierre efectivo de los proyectos.	f) Se ha desarrollado reuniones de revisión de las guías de bases y de ejecución, con enfoque de mejora continua, para las próximas convocatorias.		
					e) Se ha dado prioridad a las solicitudes de desembolso tardío, a fin de que las instituciones dispongan de tiempo para ejecutar.		
					f) Se ha verificado la normativa nacional vigente, para evaluar los requerimientos de contrapartida para las universidades públicas y adecuar los procedimientos internos.		
					g) Se han elaborado procedimientos para verificar la ejecución de la contrapartida, para contribuir a la solución de los inconvenientes reportados por las instituciones.		
	1.1.2 Fondos para Eventos Científicos (emergentes).		<u>Actividades del trimestre:</u> Se inició el periodo con tres proyectos en fase de cierre. Durante el trimestre los tres proyectos han finalizado y han entregado sus actas de cierre. Actualmente, todos los eventos han finalizado. Ventanilla 2018 Durante el trimestre, un proyecto que se encontraba en fase de cierre recibió aprobación administrativa y ha finalizado. Ventanilla 2019 Durante el trimestre, dos proyectos que se encontraban en fase de cierre recibieron aprobación administrativa y han finalizado.	No se han observado problemas o inconvenientes en el trimestre.	No aplica	Diana Romero	Ninguna.
	1.2 Fondos para Transferencia de Resultados de Investigación al Sector Privado y Público.	1.2.1 Fondos para la Creación de Oficinas de Transferencia de Tecnología y Resultados de la Investigación (OTRI).	<u>Actividades del trimestre:</u> Durante el periodo, se revisaron y verificaron los informes técnicos de avance de los proyectos. También se notificó a IBs sobre los resultados de evaluación intermedia de sus proyectos. Convocatoria 2019 y Convocatoria 2020 Se gestionaron, se revisaron y verificaron los informes técnicos de avance de los proyectos. En el trimestre pasado se notificó a las instituciones beneficiarias sobre la evaluación intermedia de sus proyectos. Durante este trimestre todas las IBs presentaron un plan de acción de la incorporación de las recomendaciones realizadas por el evaluador durante la evaluación intermedia de sus proyectos. Se gestionaron adendas y actas de cierre. En cuanto a desembolsos, si bien se han solicitado desembolsos, algunos han sido rechazados debido a que los proyectos no alcanzaban el 80% de ejecución presupuestaria para solicitar segundos desembolsos. <u>Actividades transversales del trimestre</u> Se finalizó la puesta en producción del flujo en el SPI para la convocatoria OTRI20 y OTRI19 de las siguientes tareas: Adendas. Acta de cierre	a) Complejidad en el proceso de contratación de asistencias técnicas especializadas por las OTRIs. Es decir, la oferta y el interés de proveedores locales es escaso. Esto repercute en retrasos de ejecución de las OTRIs, y falta de productos y servicios pertinentes en los procesos de transferencia tecnológica.	a) La naturaleza de los procesos de administración pública es algo que escapa al control del CONACYT, ya que como organismo estatal debe ceñirse a las leyes nacionales. Se propone que el relevoamiento de datos de proveedores locales e internacionales por parte de las OTRIs sea tenido en consideración en la planificación de la ejecución.	Diana Romero	Ninguna.
				b) Retrasos en las solicitudes de desembolso, debido a que la IB ejecutora no alcanza la ejecución presupuestaria del 80%. Esto está ligado a los retrasos en licitaciones y contrataciones.	b) Los diversos retrasos están generando adendas de extensión de contratos a las IBs públicas.		
	1.2.2 Fondos para Protección y Gestión de la Propiedad Intelectual.		<u>Datos acumulados:</u> 115 Borradores de patentes generados <u>Actividades del trimestre:</u> Durante el periodo, se exploró posibilidades con empresas extranjeras para una consultoría técnica especializada. Se gestionó y lanzó el llamado para dicha asistencia. Los resultados se dieron a conocer en el mes de julio. Convocatoria 2019 Durante el trimestre pasado se lanzó el llamado nacional de consultoría técnica especializada en junio 2021, esto por reglamento de la DNCP. El llamado se declaró desierto el 7 julio. Esto abrió la posibilidad de hacer un llamado internacional. Durante el trimestre reportado, se realizó el llamado internacional. Sin embargo, éste fue declarado desierto por falta de oferentes.	a) La escasez de instituciones que trabajen el tema de patentamiento y específicamente para la ejecución de talleres sobre el patentamiento de productos del conocimiento.	a) Contactar con empresas consultoras del extranjero para exponer los requerimientos para la realización del taller acelerado y consensuar la viabilidad de ejecución del taller. Se readeclararon los TORs para responder a al tiempo de cierre de PROCENCIA, a los requerimientos de DNCP y a los requerimientos del instrumento.	Diana Romero	Ninguna.
	1.3 Fondo para Fortalecimiento de Infraestructura y Equipamiento para la Investigación.	Laboratorios Fortalecidos y Equipados. Línea de base diseñada.	<u>Actividades del trimestre:</u> Convocatoria 2016 Durante el trimestre se trabajó en la verificación de los informes técnicos de avance y las rendiciones de cuentas de los proyectos. También se han gestionado adendas de contrato. Además, se revisó y aprobó un informe final. Convocatoria 2018 N° de proyectos en ejecución: 6 proyectos. Todos los proyectos se encuentran en periodo de ejecución. Durante el trimestre se trabajó en la verificación de los informes técnicos de avance y las rendiciones de cuentas de los proyectos.	Convocatoria 2016 a) Retrasos en la ejecución debido a: proceso de evaluación demorados por fuerza mayor que afectó al evaluador, IB públicas presentaron inconvenientes en la ejecución de la contrapartida comprometida, IB tuvieron retrasos en la ejecución de actividades, sobre todo en la recepción de equipos provenientes del extranjero. Convocatoria 2018 b) Continúan retrasos de ejecución de actividades sobre todo en procesos de licitación de las IB públicas. Esto pone en riesgo la finalización de algunos proyectos a fines del 2021. Retrasos en presentación de informes finales debido a que miembros de equipo de investigación fueron afectados por Covid-19.	Convocatoria 2016 a) Adendas a los contratos para extender el plazo de ejecución de los proyectos de las instituciones beneficiarias. Convocatoria 2018 b) La solicitud de oficio de adendas a los contratos para extender el plazo de ejecución de los proyectos de las instituciones beneficiarias, en su mayoría son del sector público.	Diana Romero	Ninguna.

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
	1.4 Acceso a Información Científica y Tecnológica: Portal CICCQ.	Acceso y usos de los servicios del portal.	<u>Datos del trimestre:</u> Durante el tercer trimestre se recibieron 1.207 solicitudes de acceso de nuevos usuarios, contando en el periodo 2015-2021 con un total de 68.544 usuarios con cuentas activadas. Se realizaron 1.310.852 búsquedas de información científica en las bases y recursos electrónicos disponibles y el descubridor bibliográfico, con una descarga de 8.390 artículos científicos a texto completo y 1.724 libros electrónicos, principalmente de recursos y bases de datos de las editoriales Elsevier y CAB. Se efectuaron 8 capacitaciones para la formación de usuarios en el manejo del portal, con la participación y el adiestramiento técnico y especializado en la búsqueda y el acceso a información científica de 359 personas. Se publicó en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la convocatoria de la licitación pública internacional para la contratación de bases de datos para el acceso a información científica y tecnológica para el Portal CICCQ, pasando por las etapas de Consultas virtuales realizadas por los potenciales oferentes, Propuestas y etapa Competitiva. Se recibió una propuesta a través de la subasta a la baja electrónica de la DNCP, de parte del oferente Servicios Integrales Infolink Limitada, quien realizó la entrega física de la oferta al CONACYT. Se adjudicó la licitación pública internacional para la contratación de bases de datos para el acceso a información científica y tecnológica para el Portal CICCQ y se firmó el contrato con el proveedor Servicios Integrales Infolink Limitada.	Ninguna	No aplica	Diana Romero	Ninguna
	1.5 Generación, Medición y Difusión de Indicadores y Estadísticas de Ciencia y Tecnología.	Generación de informes con los resultados de las encuestas.	Relevamiento de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) - Año Base 2020 Se continuó con el relevamiento de datos iniciado el trimestre pasado: se realizaron 30 reuniones virtuales de coordinación para el asesoramiento técnico a los responsables del llenado de datos en el Sistema ACT con los responsables designados de cada unidad informante. Se finalizó el relevamiento de datos el 30 de julio con un total de 349 unidades informantes. Depuración de bases de datos. Luego se realizó la validación y consistencia de datos, posteriormente se realizó el procesamiento de datos. Con estos insumos, se generaron tablas, gráficos que son los principales indicadores de Ciencia y Tecnología Paraguay 2020. Se generó el documento de Indicadores de Ciencia y Tecnología Paraguay 2020, éste fue aprobado y se encuentra disponible en la página web del CONACYT https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editor/u489/Resultados-ACT2020-Indicadores-CyT_Paraguay-2020.pdf Los resultados del relevamiento indican que la inversión en I+D al 2020 en relación con el PIB fue de 0.16%, en comparación con el año anterior que fue de 0.14%. La inversión al 2020 en términos monetarios fue de 56 millones de USD. Al mismo tiempo, es el sector público el que invierte el 74%, y dentro de este financiamiento público, es el CONACYT el que invierte el 16%. A partir de los resultados de este relevamiento se reportó a la Red de indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Iberoamericana de (RICYT) generando indicadores de Ciencia y Tecnología del Paraguay. Igualmente, los indicadores relacionados a la educación superior se reportaron a la Red Iberoamericana de Educación Superior (Red INDICES) Segundo Relevamiento Nacional de Equipos de Laboratorios dedicados a la investigación científica en Paraguay (EQUILAB) 2021 Se continuó con el relevamiento de datos iniciado el trimestre pasado. Se finalizó el relevamiento de datos el 30 de julio con un total de 172 unidades de investigación. Depuración de bases de datos. Luego se realizó la validación y consistencia de datos, posteriormente se realizó el procesamiento de datos. Con estos insumos, se generaron tablas, gráficos que forman parte del Segundo Relevamiento Nacional de Equipos de Laboratorios dedicados a la Investigación Científica y Tecnológica en Paraguay EQUILAB 2021. Se generó el documento de Indicadores de Ciencia y Tecnología Paraguay 2020, este fue aprobado por presidencia y publicado en el mes de setiembre en la web del CONACYT y en medios de prensa escrita del Paraguay. <u>Los resultados de la Encuesta EQUILAB abordan dos temas principales:</u> Equipos comprados con fondos CONACYT: indican que al 2021 hay 40 Instituciones Beneficiarias se han registrado 115 equipamiento científico tecnológico con costo de adquisición a partir de 40 millones de guaraníes, de los cuales el 70 corresponde al sector de Universidades Públicas, seguido del 15 a los Organismos Privados Sin fines de Lucro. Equipos de alta gama: Se identificaron 172 Unidades de investigación con 273 equipos de alta gama (costo de adquisición de 20.000 US\$ en adelante). Los resultados se encuentran disponibles en la página del CONACYT https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editor/u489/Resultados-EQUILAB-2021.pdf	Relevamiento de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) - Año Base 2020, y Segundo Relevamiento Nacional de Equipos de Laboratorios dedicados a la investigación científica en Paraguay (EQUILAB) 2021 a) La renuncia de 1 técnico encuestador para ACT. b) Falta de espacio físico para el personal contratado. Algunos deben acudir en forma intercalada. c) La falta de personal técnico informático exclusivo para el seguimiento y control del sistema de registro de datos y la mitigación de los posibles errores del sistema, durante el periodo de recolección de datos. d) Problemas debido a cambio de la modalidad de trabajo de encuestadores a una 100% virtual por el mes de julio. Asimismo, dificultades asociadas a la pandemia del COVID-19 con las Unidades informantes y de investigación.	Relevamiento de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) - Año Base 2020, y Segundo Relevamiento Nacional de Equipos de Laboratorios dedicados a la investigación científica en Paraguay (EQUILAB) 2021 a) Se gestionó la incorporación de un Profesional Junior para cubrir las necesidades de recursos humanos. b) Se gestionó espacio físico para tres encuestadores en oficinas del CONACYT, y también se trabajó a distancia. c) La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC), designó a un técnico informático para apoyo en las actividades de seguimiento del sistema de registro de datos y la mitigación de los posibles errores del sistema. d) Se tercerizó el desarrollo del sistema EQUILAB 2021. Sin embargo, se hace seguimiento con el apoyo del personal técnico informático del CONACYT.	Diana Romero Nathalie Alderete Marina Navarro	Ninguna.
Componente II: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	2.1. Financiamiento de Maestrías y Doctorados Nacionales, orientados a la Formación de Investigadores	Programas de posgrados adjudicados.	<u>Actividades del trimestre:</u> Convocatoria 2016: Se realizó la verificación de informes técnicos semestrales y finales de los programas de posgrado. Por otra parte, se iniciaron las actividades tendientes a la firma de un acta de cierre. Así también, se realizaron actividades de actualización de la información disponible en la página web de CONACYT correspondiente a un programa de posgrado. Nº de informes técnicos semestrales verificados: 2 informes. Nº de actas de cierres en proceso de firma: 1 acta de cierre. Actualización de información en la web: 1 posteo. Convocatoria 2017 Se realizó la verificación de informes técnicos semestrales y finales, así también se gestionó el desembolso de tres programas de posgrado tras la aprobación del informes técnicos y administrativos correspondientes. Asimismo, se otorgó una adenda para prorrogar el plazo de ejecución de un programa de posgrado. Así también, se iniciaron las gestiones para la firma un acta de cierre en marco de la convocatoria. Nº de informes técnicos semestrales verificados: 5 informes técnicos semestrales. Nº de informes técnicos finales verificados: 2 informe verificado y aprobado. Nº de adendas otorgadas: 1 adenda a programas de posgrados Nº de desembolsos realizados: 3 desembolsos a programas de posgrado Nº de actas de cierres en proceso de firma: 1 acta de cierre. <u>Actividades transversales del trimestre</u> Se realizó el seguimiento de tesis post a estudiantes que fueron beneficiados indirectos del instrumento, esto de forma a conocer el estado académico y profesional de los estudiantes posterior a la presentación de los informes finales efectuado por los programas de posgrado. Cabe mencionar que, al momento, presentación del informe final de un programa de posgrado no siempre todos los estudiantes defienden la tesis de posgrado. Se elaboró un informe de manera a dar respuesta a una solicitud del Consejo de Administración del FEEI. Se actualizó el espacio denominado: Tesis de Becarios disponible en la página web de CONACYT (https://www.conacyt.gov.py/view-inventario-de-tesis) de manera a contar con las tesis de los estudiantes egresados de los programas de maestrías y doctorados del instrumento, que a la fecha cuenta con 234 (doscientos treinta y cuatro) tesis de maestrías y doctorados. En el trimestre se publicaron la cantidad de 14 (catorce) tesis. Se actualizó el espacio denominado: producción de becarios disponible en la página web de CONACYT (https://www.conacyt.gov.py/producción_becarios) de manera a contar con los posters de los estudiantes egresados de los programas de maestrías y doctorados del instrumento, que a la fecha cuenta con 75 (setenta y cinco) posters de resultados publicados.	a) Retrasos en el cierre de los programas. Esto debido a la existencia de adendas otorgadas a las instituciones beneficiarias que extienden la vigencia de los programas de posgrado, refiriendo fundamentalmente la necesidad de un mayor plazo para garantizar la realización de las defensas de tesis, la presentación de rendiciones de cuenta y demás gestiones administrativas.	a) Se establecerán procedimientos estandarizados a través de Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), de manera a poder responder de manera eficiente a las problemáticas existentes en el instrumento específicamente para la rendición de cuentas y gestiones administrativas.	Paz Bareiro	Ninguna.
	2.2. Financiamiento de Incentivos para la Excelencia en Investigación y Desarrollo.	2.2.1. Incentivos para la Formación de Investigadores en Posgrados Nacionales.	<u>Actividades del trimestre:</u> Convocatoria 2015: Se cuenta 2 (dos) becarios del programa de posgrado 14-POS-007 que cuentan con una extensión de vigencia de sus cartas de compromiso, para de esta de forma poder cumplir con todos los procesos de presentación de tesis y evitar las posibles sanciones por incumplimiento establecidas en el reglamento del instrumento. Cabe mencionar, que se prevé la defensa de uno de los becarios de posgrados para el 06 de octubre de 2021. Nº de informes finales verificados y aprobados: 1 informes. Convocatoria 2017: Durante el periodo, se realizaron gestiones de adenda a los contratos de manera a prorrogar la vigencia de los contratos con los becarios incentivados. Así también, se verificaron y aprobaron informes técnicos finales de becarios. Igualmente, se efectuaron todos oficios para la publicación de pósters y tesis de los trabajos de investigación, que superaron el periodo reglamentario de siglo, correspondiente a los becarios que finalizaron los programas de posgrado cofinanciados por el CONACYT. Asimismo, en el periodo, se cumplió con la gestión de los desembolsos mensuales a los becarios incentivados activos del programa. Nº de adendas otorgadas: 6 adendas a incentivados. Nº de informes técnicos finales verificados y aprobados: 10 informes. Cantidad de pósters y tesis publicadas en la web: 10 pósters y tesis de becarios. Convocatoria 2018: Durante el periodo, se realizaron gestiones de adenda de manera a prorrogar la vigencia de los contratos con los becarios incentivados. Así también, se verificaron y aprobaron informes técnicos finales de becarios. Igualmente, se efectuaron todos oficios para la publicación de un póster y tesis del trabajo de investigación, que superó el periodo reglamentario de siglo, correspondiente a un becario que finalizó el programa de posgrado cofinanciado por el CONACYT. Asimismo, en el periodo, se cumplió con la gestión de los desembolsos mensuales a los becarios incentivados activos del programa. Nº de adendas otorgadas: 10 adendas a incentivados. Nº de informes finales verificados y aprobados: 14 informes. Nº de póster y tesis publicadas en la web: 1 póster y tesis de becarios. <u>Actividades transversales del trimestre:</u> Se han realizado ajustes a los flujos de procesos y tareas vinculadas a la presentación de informes de cierre de becarios incentivados en el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI). Se trabajó en el ajuste del Plan de Cierre Plan de cierre del instrumento. Se dio inicio a redacción del informe de cierre del instrumento, conforme a lo establecido en el plan de cierre del programa.	a) Los estudiantes no lograrán defender sus tesis de posgrados en los plazos de culminación establecidos por los programas de posgrado.	b) Considerando el gran número de estudiantes que no lograrán defender sus tesis de posgrados en los plazos de culminación establecidos por los programas de posgrado se resolvió otorgarles una ampliación de plazo a sus contratos de manera a dar más tiempo para la defensa de las tesis de posgrado.	Paz Bareiro	Ninguna.
		2.2.2 Financiamiento para la Vinculación de Científicos y Tecnólogos.	El instrumento no implementó ninguna actividad en el trimestre.	Ninguna	No aplica	Paz Bareiro	Ninguna.
Componente III: Sistema de Investigadores del Paraguay	3.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONI).	Investigadores categorizados.	<u>Actividades del trimestre:</u> Nº investigadores categorizados: 445 investigadores categorizados; entre investigadores activos y asociados clasificados según nivel alcanzado dentro del sistema, se detallan a continuación: 1) Nivel Candidato: 110, 2) Nivel I: 238, 3) Nivel II: 68, 4) Nivel III: 16, y finalmente se completa la lista con 5) la categoría de emeritos: 13 investigadores. Convocatoria I/2020 Durante el periodo, se realizaron las gestiones para la suscripción de adenda con los investigadores que obtuvieron resultados en la convocatoria I/2020. Estos retiraron el pago de incentivo del incentivo correspondiente al segundo semestre. Convocatoria II/2020 En el periodo se obtuvieron los resultados de las reconsideraciones solicitadas producto de las evaluaciones de la convocatoria II/2020. Estos resultados se encuentran plasmados en las resoluciones N° 349/2021 N° 354/2021 disponibles en el enlace web: https://www.conacyt.gov.py/node/29116 . Así también, se efectuaron las solicitudes correspondientes para el pago anual de incentivos para aquellos investigadores que pidieron la reconsideración de sus evaluaciones. Convocatoria I/2021 Durante el trimestre realizó el lanzamiento de la Convocatoria I/2021 para la permanencia para los investigadores categorizados en él: (1) Nivel I – Convocatoria I/2019 (Resolución N°664/2019; N°061/2020), (2) Nivel I – Convocatoria II/2018 (Resolución N°144/2019; N° 438/2019), (3) Nivel I – Ventanilla Repatriación 2018 (Resolución N°124/2019), (4) Nivel II – I/2018 (N°310/2018; N°143/2019), y (5) Nivel II – Ventanilla Repatriación 2018 (Resolución N°922/2018). En este sentido también se avanzó con el proceso evaluativo, considerando que la evaluación primaria encarriló por las Comisiones Técnicas de Área ya se encuentra concluida, mientras que la evaluación secundaria realizada por el Comité de Selección, se encuentra en desarrollo.	a) Falta de procedimientos claros que permitan la generación de documentos con lineamientos, reglas, condiciones y compromisos para el otorgamiento de beneficios en marco del instrumento (contratos, adendas y otros). b) Ausencia de un sistema de información automatizado del PRONI, que se alimente de los softwares disponibles en el CONACYT, de manera a facilitar el control y seguimiento del instrumento. c) Se realizaron ajustes en el sistema de pagos del SPI, lo que afectó al tiempo de desembolso.	a) Se prevé la actualización de los procedimientos correspondientes a la generación de documentos contractuales. b) Reuniones con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC) del CONACYT y la empresa contratada para desarrollo de software de manera a ver los mecanismos que permitan la sistematización de datos del PRONI. c) Para subsanar la demora en el tiempo de los desembolsos se requirió de la carga de manera manual de datos históricos del instrumento y la validación minuciosa de estos datos.	Nathalie Alderete	Ninguna.

Componente	PRODUCTOS SEGÚN ML	Actividades Programadas	Acciones Realizadas	Problemas/ Dificultades	Acciones a ser implementadas	Responsable	Observaciones
			Actividades complementarias del trimestre: La Comisión Científica Honoraria del PRONI mantuvo sus reuniones ordinarias con regularidad. Se gestionó la adenda a los contratos, así como el pago de incentivos de tres investigadores categorizados del PRONI, en el marco del Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior (PRRIE). Se realizó la actualización de etiquetas disponibles en el Currículo Vitae Paraguayo (CVPy) de investigadores categorizados en el PRONI. La Coordinación del Componente III participó en calidad de representante del CONACYT ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados en las mesas de diálogo de cara a la presentación de un anteproyecto de ley que pretende crear de marco normativo para el Investigador Paraguayo. Se colaboró con la provisión de datos para el desarrollo del proyecto de investigación con código PHN18-1608 denominado Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación: Evaluación de Impacto del PRONI de Investigación para el Desarrollo (ID). Se definieron los criterios de evaluación por área de la ciencia identificados dentro del instrumento. Estos criterios de evaluación fueron elevados a instancias del Consejo de CONACYT. Se realizó una encuesta a los investigadores con el fin de identificar el nivel de satisfacción los investigadores categorizados con respecto al PRONI y recoger recomendaciones. Para conocer oportunidades de mejora de nuestro sistema, se elaboró un informe sobre el funcionamiento de los Sistemas de Investigadores coordinados por los organismos nacionales de ciencia y tecnología de la región. Se iniciaron acciones de manera a contar con Registro Único del Beneficiario (RUB), de manera a disponer con la información legal y administrativa centralizada de las personas físicas que cuentan con un beneficio en marco de los programas y proyectos implementados desde CONACYT. Este desarrollo sería algo similar al Registro de Organizaciones de Ciencia y Tecnología (ROCTI) implementado en el año 2018 y será de gran utilidad para instrumentos con beneficiarios del tipo persona física. Se generó en la plataforma MOODLE un espacio para compartir información con los miembros del Consejo de CONACYT, de manera a agilizar el flujo de información entre el componente y los miembros del Consejo de CONACYT. Esta plataforma permite a los miembros del consejo, además del acceso a información pomenorizada relacionada con el PRONI, la creación de espacios de discusión para la formación de opiniones en base al consenso, lo que se traducirá en la toma decisiones más críticas e informadas.				
	3.2 Programa de Repatriación y Radicación de Investigadores del Exterior.	Investigadores repatriados.	Actividades del trimestre: Se aprobó el informe final un investigador repatriado/radicado correspondiente a la ventanilla 2016. Se realizaron gestiones para la obtención de dos actas de cierre firmadas correspondientes a 2 (dos) investigadores repatriados/radicados de la ventanilla 2018. Se efectuaron los trámites para la firma de 1 (una) adenda de manera a prorrogar el plazo de vigencia del contrato, para así completar los trámites de cierre. Se dio curso a las solicitudes de pago de investigadores repatriados/radicados, que cuentan con los informes verificados y aprobados. Se están realizando los oficios correspondientes para extender los contratos de los beneficiarios del instrumento que tendrán continuidad con PROCENCIA II. De igual manera, se abordaron las actividades consideradas como transversales vinculados con el logro de objetivos en marco del instrumento: Se diseñaron nuevos procesos en el flujo de las convocatorias en el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) correspondiente al instrumento, de manera a contar con la trazabilidad de todos los procesos llevados a cabo, correspondientes a la propuesta institucional para las tareas de planificación y adenda de contrato. Se dio inicio a redacción del informe de cierre del instrumento, conforme a lo establecido en el plan de cierre del programa.	1) La migración de datos históricos en el SPI, para la implementación del módulo de pagos, requiere de la carga de manera manual de datos históricos del instrumento y la validación minuciosa de estos datos.	1) El equipo técnico del Componente finalmente tuvo a su cargo la carga manual de datos históricos mientras que la validación bajo la responsabilidad del Departamento de Finanzas de la Dirección General de Administración y Finanzas.	Nathalie Alderete	Ninguna.
	4.2 Formación Docente para la investigación como Estrategia de Aprendizaje.	Docentes formados a través de la cátedra CTS.	Actividades del trimestre Cursos MOOC de la Cátedra CTS en EDX: N° de docentes y técnicos adjudicados de cursos MOOC de la Cátedra CTS: 50 adjudicados N° de docentes y técnicos participantes de cursos MOOC de la Cátedra CTS: 147 participantes N° de docentes y técnicos certificados en cursos MOOC de la Cátedra CTS: 40 participantes certificados En el trimestre se ha implementado el primer curso denominado: El Enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología: la ciencia, el futuro y las aulas. Este curso ha finalizado con 40 participantes certificados que han aprobado el curso. El presente curso cuenta con una segunda edición de estudiantes con 47 participantes. Igualmente, en el periodo se encuentra en desarrollo el segundo curso denominado La investigación interdisciplinaria: la enseñanza por proyectos, que cuenta con 50 participantes. Actividades transversales del trimestre: Durante el trimestre, se han realizado gestiones para el diseño metodológico de los módulos en formato MOOC, que estará disponible en la plataforma EDX y MOODLE. Se realizaron gestiones para la cierre del acuerdo de co-gestión de fondos suscrito con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura N° 04/2015. Se aplicó un cuestionario de preguntas a los participantes del curso 1 primera edición sobre la satisfacción del curso El enfoque de CTS en la enseñanza de la ciencia y la tecnología: la ciencia, el futuro y las aulas.	a) El tipo de membresía que CONACYT posee con la plataforma EDX sólo permite la participación de 50 personas por edición del curso.	a) Se habilitó, además de la plataforma EDX, la plataforma MOODLE para poder responder al alto nivel de interesados en los cursos MOOC de la Cátedra CTS.	Paz Bareiro	Ninguna.
	4.3 Programa Centros de Recursos de Aprendizaje para la Ciencia y la Tecnología.	Accesos a los Recursos Virtuales para el Aprendizaje (REVA).	Actividades del Trimestre Se realizaron gestiones para la publicación de un llamado a licitación pública para la contratación de servicios que permitirán la implementación de repositorio institucional. Del mismo modo, durante todo el trimestre se realizaron las gestiones para el acceso a los contenidos adquiridos a perpetuidad en marco del instrumento.	a) No se cuenta con capacidad institucional para implementación del repositorio institucional.	a) Se planifica la contratación servicios que permitirán la implementación de repositorio institucional y la capacitación de talento humano contratado por el CONACYT.	Paz Bareiro	Ninguna.
	4.4 Concursos de Comunicación y Periodismo Científico.	Concurso de Comunicación y Periodismo Científico.	Actividades del trimestre: Durante el periodo, se realizó la entrega de premios a los distintos ganadores de las categorías que conforman los tres tipos de Concursos de Comunicación y Periodismo Científico, los cuales se detallan a continuación: X Premio Nacional del CONACYT al Periodismo Científico 2021: La entrega de premios a los ganadores se realizó bajo la modalidad presencial, en el acto se concedió a la siguiente cantidad de personas según las categorías: (1) Diarios impresos: 1 ganador, (2) Portales digitales: 1 ganador. Las categorías de (3) Radio y (4) Televisión fueron declaradas desierto. IV Premio al Periodismo Científico MERCOSUR 2021: La entrega de premios a los ganadores se realizó bajo la modalidad virtual, en el acto se concedió a la siguiente cantidad de personas según las categorías: (1) Escrita profesional: 4 ganadores adjudicándose un primer, segundo y tercer puesto, además de una mención de honor, (2) Escrita Junior: 1 ganador, declarándose desierto el segundo y tercer puesto. II Concurso Nacional de Fotografía Científica del CONACYT 2021: Al igual que el Premio Nacional del CONACYT al Periodismo Científico la entrega de premios a los ganadores se realizó bajo la modalidad presencial, en el acto se concedió a la siguiente cantidad de personas según las categorías: (1) Investigación Científica ante la COVID-19: 3 ganadores, (2) La tecnología en tiempos de pandemia: 3 ganadores, (3) Ciencia en Casa: 3 ganadores. Actividades Transversales: Gestiones administrativas para la entrega de los premios monetarios a los ganadores de los tres tipos de premios en marco del instrumento. Provisión de datos a la Coordinación de Monitoreo y Evaluación para la construcción de Base de Datos considerando los nuevos beneficiarios del instrumento. Actividades de promoción y difusión de los eventos de premiación en los medios de comunicación nacional e internacional.	a) Ausencia de procedimientos administrativos estandarizados para la entrega de premios monetarios.	b) Se contó con el apoyo de direcciones internas que coadyuvaron en las gestiones de manera a concretar la entrega de los premios a los ganadores.	Paz Bareiro	Ninguna.
	4.5 Diseño de Espacios y Museos de Ciencia y Tecnología.	Consultoría para el diseño del modelo de espacios interactivos para CyT.	Actividades del trimestre: Se ha mantenido sesiones virtuales con miembros de la RED POP, para coordinar un conversatorio para conocer experiencias de espacios interactivos de CyT.	Ninguna	No aplica	Paz Bareiro	Ninguna.
	4.6 Apoyo a Ferias, Olimpiadas y Concursos de Ciencias.	Auspicios para la participación en ferias y olimpiadas de CyT.	Actividades del trimestre: Apoyos económicos En cuanto a los apoyos económicos brindados a instituciones, se están realizando gestiones para finalizar los acuerdos en marco del instrumento. Se continuó con las actividades de revisión general del estado de todos los acuerdos suscritos para el apoyo económico a ferias, olimpiadas y concursos de ciencia, el cual arrojó la identificación de tres instituciones con incumplimientos de los acuerdos suscritos, que deben ser resueltos para el último trimestre del año 2021. Premio Nacional Juvenil de Ciencias Pierre et Marie Curie 2021 (PPMC 2021) Se continúan con las gestiones de cara al PPMC 2021, esto incluye: la difusión de la convocatoria a través de los medios de comunicación del CONACYT, el acompañamiento a las postulaciones de instituciones educativas del país, la admisión de postulantes que reúnan los requisitos documentales solicitados, la identificación de evaluadores según el área de conocimiento en el cual se encuentra enmarcada cada proyecto de investigación y el acompañamiento y soporte a los investigadores encargados de la etapa de evaluación. Cabe mencionar, que se tiene prevista la presentación de los trabajos para el mes de octubre.	Apoyos a ferias, olimpiadas y concursos de ciencia a) Serios retrasos en los procesos de cierre de acuerdos de apoyos económicos con las instituciones educativas.	Apoyos a ferias, olimpiadas y concursos de ciencia a) Se prevé la remisión de notas de emplatamiento a las instituciones educativas con incumplimientos.	Paz Bareiro	Ninguna.
Componente V: Gestión de Proyecto (UG)	A.5.1 Gestión General del Proyecto		Informes de la gestión de avance del Programa Fueron presentados 3 Informes de avances (Julio a Septiembre 2021), correspondientes al Plan Operativo Institucional (POI) los cuales fueron cargados en el Sistema Planificación por Resultados -SPR de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). Se ha presentado el avance del PEP en el mes de agosto. Evaluación Final Se ha iniciado el proceso de expresión de interés para la identificación de posibles firmas consultoras o personas físicas interesadas en realizar el trabajo de consultoría externa para la evaluación. Se cuenta con lo términos de referencia y los criterios de evaluación.	Ninguna	No aplica	Hugo Ortiz Alejandra Samaniego	Ninguna.
	A.5.2 Gestión de personas, de recursos presupuestarios, financieros y contables		Administración de Personal Se han procesado Planillas de Remuneraciones básicas y Adicionales Se ha procedido a la presentación de remuneraciones en la plataforma de la SFP-SICCA Se han realizado notificaciones por incumplimiento del Reglamento Interno. Selección y Admisión Elaboración del Reglamento específico para la contratación de profesionales, técnicos y consultores para programas y proyectos conforme a la Resolución FEEI N° 10/2021. Departamento de Presupuesto (DP) Modificación del Cronograma aprobado ante la AFD y el CAFEEL. Informes mensuales y cuatrimestrales respondidos en tiempo y forma. Emisión de Certificados de disponibilidad presupuestaria Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTIC) Se realizaron mantenimiento a convocatorias ya existentes.	Departamento de Presupuesto (DP) Baja ejecución de proyectos en cuanto a la planificación inicial. Falta de procedimientos definidos o con plazos establecidos para los procesos de ampliación y creación de nuevas actividades/proyectos. Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTIC) La falta de RRHH, para llevar adelante los trabajos. Demora en los tiempos para la construcción de las convocatorias.	Departamento de Presupuesto (DP) Priorizar/aplicar las acciones ya establecidas en el Cronograma de trabajo. Procedimentar/aplicar las acciones tomadas en reuniones de trabajo. Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTIC) Contratación de RRHH. Mejorar los tiempos de los pedidos, sobre la construcción de las convocatorias.	Hugo Ortiz Roberto Delgado	Ninguna.
	A.5.3 Gestión de control y de rendición de cuentas		Rendición de cuentas Desarrollo e implementación de mecanismos para cierres de proyectos financiados por el Programa PROCENCIA. Implementación de procedimientos para cierre de Acuerdos específicos de cooperación con agencias especializadas. (OEI) Implementación de seguimiento administrativo de proyectos, además de acuerdos específicos de cooperación con agencias especializadas.	Rendición de cuentas. Falta de Recursos Humanos para la verificación de las Rendiciones de Cuentas y procesos administrativos.	Rendición de cuentas Implementación de un cronograma para el cierre de todos los proyectos financiados por el programa PROCENCIA.	Hugo Ortiz	Ninguna.

PARTE 11 - RESUMEN METAS LOGRADAS

							FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
							30/09/2021	CONACYT
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2022	META LOGRADA Acumulada 30/09/2021	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN	
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.1. Fondos concursables de proyectos de I+D I.1.1. Proyectos de investigación y desarrollo	Proyectos de I+D adjudicados	638	649	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	14-INV-xxx PINV15-xxxx PINV18-xxxx PINV20-xxxx BPIN20-xxxx		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.1. Fondos concursables de proyectos de I+D I.1.2. Eventos científicos emergentes	Eventos científicos emergentes adjudicados	40	49	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	VEVE16-xx VEVE17-xx VEVE18-xx VEVE19-xx		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.2. Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público I.2.1. Oficinas de transferencia de resultados de la investigación (OTRI)	OTRI	6	8	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	OTRI16-xxx OTRI19-xxx OTRI20-xxx		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.2. Fondos de transferencia de resultados de I+D al sector privado y público I.2.2. Protección y gestión de los resultados de la investigación	Borradores de solicitud de patentes	60	115	http://www.conacyt.gov.py/node/23301			
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.3. Fondo para fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación	Laboratorios	21	23	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	LABO16-xxx LABO18-xxx		
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.4. Acceso a información científica y tecnológica: Portal CICCOC	Portal	1	1	http://www.cicco.org.py/			
Componente 1: Fomento a la Investigación Científica	I.5. Generación, medición y difusión de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología	Set de encuestas	7	5	http://www.conacyt.gov.py/node/23334 http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u294/Indicadores_CyT_2016_0.pdf http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u274/Indicadores-CyT-2017.pdf https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/upload_editores/u274/Indicadores-CyT-Paraguay-2018.pdf		En el primer link de acceso se encuentran dos sets de Indicadores de CyT: Encuesta sobre Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) Años 2014/2015 y la Encuesta de Percepción Pública de Ciencia y Tecnología. El segundo link corresponde a los resultados principales de la Encuesta ACT Año Base 2016. El tercer link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2017. Elcuarto link corresponde a los resultados de principales de la Encuesta ACT Año 2018.	
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.1. Financiamiento de maestrías y doctorados nacionales orientados a la formación de investigadores II.1.1. Proyectos de creación y fortalecimiento de maestrías y doctorados de excelencia	Programas de posgrados adjudicados	35	35	https://datos.conacyt.gov.py/proyectos	14-POS-xxx POSG16-xxx POSG17-xxx		
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.2. Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo II.2.1 Incentivos para la formación de investigadores en posgrados nacionales	Estudiantes con incentivo	222	220	https://datos.conacyt.gov.py/becas			
Componente 2: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D	II.2. Financiamiento de incentivos para la excelencia en investigación y desarrollo II.2.4. Financiamiento para la vinculación de científicos y tecnólogos	Estancias de vinculación	267	267	http://www.conacyt.gov.py/node/23285			
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	III.1 Programa Nacional de Incentivo al Investigador (PRONII) III.1.1 Programa nacional de incentivo al investigador (PRONII)	Investigadores categorizados	732	745	https://datos.conacyt.gov.py/proniis			

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	UNIDAD	META PROGRAMADA 2022	META LOGRADA Acumulada 30/09/2021	LINK DE ACCESO	EJEMPLOS CÓDIGOS DE BUSQUEDA	OBSERVACIÓN
Componente 3: Sistema de Investigadores del Paraguay	III.2 Programa de repatriación y radicación de investigadores III.2.1 Programa de repatriación y radicación de investigadores del exterior	Investigadores repatriados/radicados	9	12	http://www.conacyt.gov.py/node/23472		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.2. Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje IV.2.1 Formación docente para la investigación como estrategia de aprendizaje (Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS)	Personas formadas	400	662	http://www.conacyt.gov.py/node/23276		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.3 Programa centros de recursos para el aprendizaje para la ciencia y tecnología IV.3.1 Biblioteca virtual escolar (Recursos Virtuales para el Aprendizaje – ReVA)	Plataforma	1	1	http://revaconacyt.org/		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.4. Concursos de comunicación y periodismo científico IV.4.1. Concurso comunicación y periodismo científico	Concursos	5	10	http://www.conacyt.gov.py/premio-de-periodismo-cientifico		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.5. Diseño de espacios y museos de CyT IV.5.1. Espacios interactivos de ciencia y tecnología	Asesoría técnica	1	1	N/A		
Componente 4: Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología.	IV.6. Apoyo a ferias, olimpiadas y concursos de ciencias IV.6.1. Ferias, olimpiadas y concursos de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI	Actividades científicas	39	49	N/A		

Componente 4. Iniciación y Apropiación social de la Ciencia y la Tecnología: Apoyo a Ferias, Olimpiadas y Concursos de Ciencias

FECHA DE ULTIMA DE ACTUALIZACIÓN	
31/09/2021	CONACYT

Nº	Año	Nombre Actividad/Institución	Lugar de Realización	Tipo	Estado	Monto Adjudicado G.	Nº Resolución Adjudicación/Convenio
1	2014	Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos - INCUPAR	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	16.000.000	350/2014
2	2015	Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	110.000.000	131/2015
3	2015	13º Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	5.700.000	151/2016
4	2015	Asociación de Padres del Colegio Nacional EDM Mcal. Estigarribia	Carapegua - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	28.176.840	464/2015
5	2015	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso	Organizador	Finalizado	550.000.000	Acuerdo 02/2015
6	2016	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	5.000.000	163/2016
7	2016	Colegio Nacional Miguel Ángel Rodríguez	México	Apoyo Económico	Entregado	22.740.750	191/2016
8	2016	Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA	Argentina - Chile	Apoyo Económico	Entregado	70.020.000	257/2016
9	2016	Asociación Fullbright - AFP	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	369/2016
10	2016	Universidad Iberoamericana - UNIBE	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	62.250.000	371/2016
11	2016	14º Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	6.300.000	573/2016
12	2016	Sociedad de Estudios Astronómicos - SEA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	673/2016
13	2016	Sociedad Científica del Paraguay - SCP	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	674/2016
14	2016	Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos - INCUPAR	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	678/2016
15	2016	Reeduca Paraguay S.A.	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	10.000.000	95/2016
16	2016	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso - Paraguay	Organizador	Finalizado	1.339.835.150	Acuerdo 01/2016
17	2017	Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	60.000.000	332/2017
18	2017	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	60.000.000	466/2017
19	2017	ACES - Colegio Fernando de la Mora	Louisville - EEUU	Apoyo Económico	Entregado	9.790.000	496/2017
20	2017	Reeduca Paraguay S.A.	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	25.000.000	504/2017

Nº	Año	Nombre Actividad/Institución	Lugar de Realización	Tipo	Estado	Monto Adjudicado G.	Nº Resolución Adjudicación/Convenio
21	2017	ACES - Colegio Mcal. Estigarribia de Carapeguá	Recife - BrasilValledupar - Colombia	Apoyo Económico	Entregado	49.755.300	539/2017
22	2017	Colegio Privado Nuestra Señora de Schoenstatt	Mérida - México	Apoyo Económico	Entregado	2.241.720	597/2017
23	2017	Fundación Colegio Santo Tomás de Paraguarí	Entre Ríos - Argentina	Apoyo Económico	Entregado	15.840.000	600/2017
24	2017	15º Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	4.500.000	658/2017
25	2017	Asociación Obra Don Luis Guanella	Louisville - EEUU	Apoyo Económico	Entregado	11.060.000	677/2017
26	2017	Colegio Nacional EMD Miguel Ángel Rodríguez	Barranquilla - Colombia	Apoyo Económico	Finalizado	19.152.000	688/2017
27	2017	Unión Industrial Paraguaya - UIP	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	5.000.000	691/2017
28	2017	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso - Paraguay	Organizador	Finalizado	1.290.000.000	Acuerdo 01/2017
29	2018	16º Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	6.000.000	121/2019
30	2018	Colegio Privado Nuestra Señora de Schoenstatt	Puerto Rico	Apoyo Económico	Entregado	19.493.600	204/2018
31	2018	Colegio Nacional E.M.D Asunción Escalada	Antofagasta - Chile	Apoyo Económico	Entregado	20.497.200	266/2018
32	2018	Universidad del Cono Sur de las Américas - UCSA	Kentucky - EEUU	Apoyo Económico	Entregado	25.000.000	450/2018
33	2018	Colegio Nacional Mcal. Estigarribia de Carapeguá	Santa Catarina - Brasil	Apoyo Económico	Entregado	16.380.000	451/2018
34	2018	Fundación Los Laureles	Distrito Federal - México	Apoyo Económico	Entregado	12.312.000	478/2018
35	2018	Colegio Politécnico Coop. Capiatá LTDA	Capiatá - Paraguay	Apoyo - Auspicio	Entregado	8.200.000	538/2018
36	2018	Escuela "Heinfriend Wolfgang Kress" Itapúa	Kentucky - EEUU	Apoyo Económico	Entregado	27.750.000	618/2018
37	2018	Universidad San Carlos	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	25.000.000	625/2018
38	2018	Colegio Santo Tomás de Paraguarí	Valledupar - Colombia	Apoyo Económico	Entregado	6.927.000	669/2018
39	2018	Fundación Los Laureles	Asunción - Paraguay	Apoyo Económico	Finalizado	30.000.000	69/2018
40	2018	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso - Paraguay	Organizador	Finalizado	1.371.219.007	Acuerdo 01/2018
41	2019	Colegio Privado Nuestra Señora de Schoenstatt	Bayamón - Puerto Rico	Apoyo Económico	Entregado	19.493.600	161/2019
42	2019	Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos - OMAPA	Buenos Aires - Argentina	Apoyo Económico	Entregado	20.000.000	629/2019

Nº	Año	Nombre Actividad/Institución	Lugar de Realización	Tipo	Estado	Monto Adjudicado G.	Nº Resolución Adjudicación/Convenio
43	2019	Colegio Nacional de E.M.D. Asunción Escalada	Abu Dabi - Emiratos Árabes Unidos	Apoyo Económico	Entregado	18.360.000	662/2019
44	2019	Colegio Técnico Nacional	Abu Dabi - Emiratos Árabes Unidos	Apoyo Económico	Entregado	20.000.000	694/2019
45	2019	ACES - Colegio Nacional de E.M.D. Mcal. José Félix Estigarribia	Carapegua - Paraguay	Apoyo Económico	Entregado	6.500.000	726/2019
46	2019	Fundación Colegio Santo Tomás	Lima - Perú	Apoyo Económico	Entregado	17.480.320	728/2019
47	2019	17º Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	3.700.000	789/2019
48	2019	Stand Expo MRA	Mariano Roque Alonso - Paraguay	Organizador	Finalizado	1.400.000.000	Acuerdo 02/2019
49	2020	18º Edición Premio Marie Curie	Asunción - Paraguay	Co-organizador	Finalizado	16.899.000	486/2020

*El apoyo económico otorgado a la Universidad San Carlos ascendió a G. 80.000.000, de los cuales 25.000.000 correspondieron a fondos correspondientes al Programa PROCENCIA (FF30), los G.55.000.000 restantes se financiaron con recursos propios del CONACYT (FF10)
